


《 参 考 資 料 》

- (1) 円滑な施工の確保のための仕組み
- (2) 円滑な施工の確保のための仕組みの一体的運用事例
(北陸地方整備局の事例)
- (3) 用語の解説


(1) 円滑な施工の確保のための仕組み

三者会議の取り組み



・三者会議とは、

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者（設計担当・工事担当）、設計者、施工者の三者による『三者会議』を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る取り組み

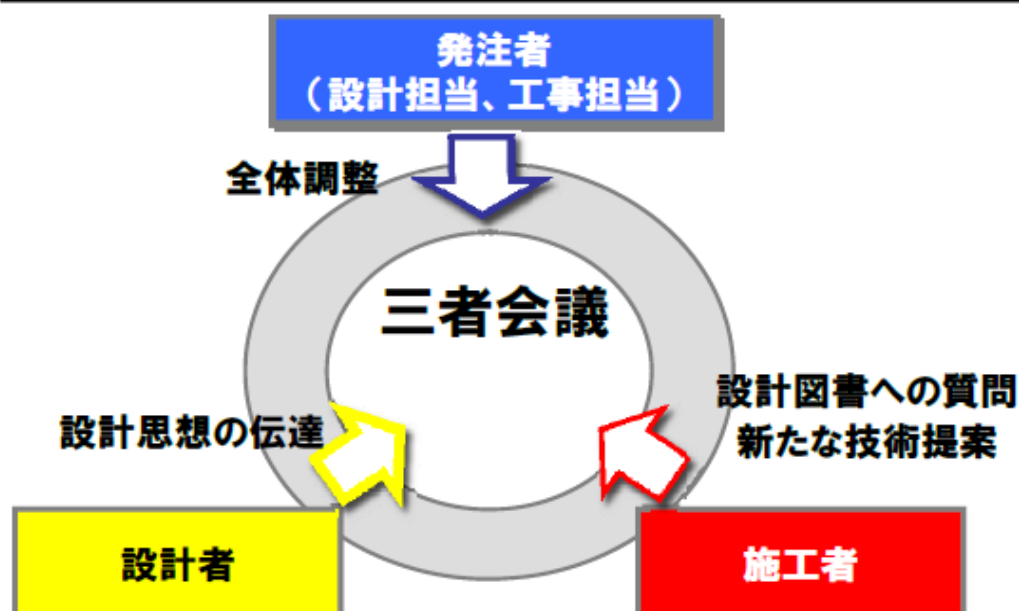


やりとりの例

- ・設計の考え方の説明（設計者）
- ・照査結果の報告（施工者）
- ・関係機関との調整状況等（発注者）

設計変更審査会

- ・設計変更審査会とは、
設計変更の手続きの透明性と公平性の向上及び迅速化を目的として、発注者と請負者が設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う取り組み

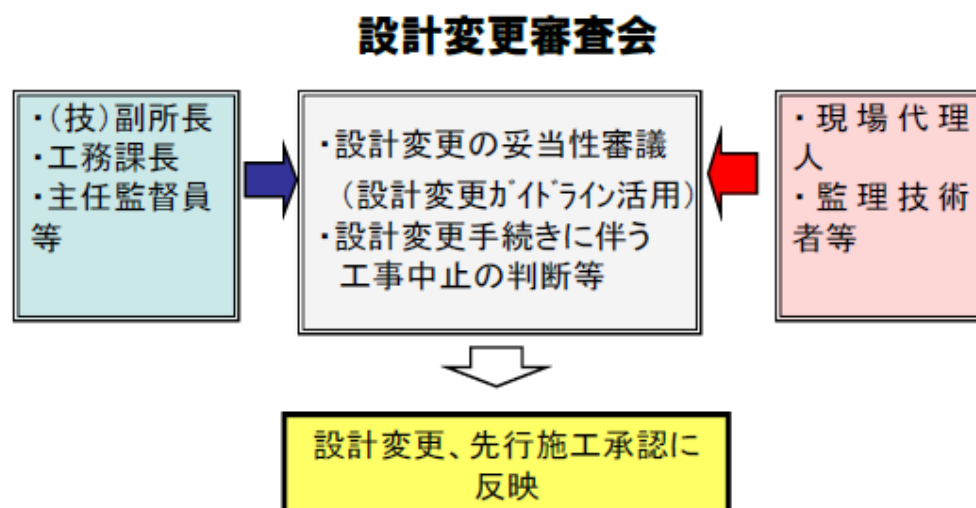


やりとりの例

- ・用地取得難航による施工方法の変更協議
- ・地下水位の変更に伴う土留め工法の変更
- ・天災等に伴う工事中止の判断及び中止に伴う増加費用の協議

出典：国土交通省

ワンデーレスポンス




・ワンデーレスポンスとは、

工期が1日延びる損失を受発注者で認識し、双方で問い合わせ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することにより、待ち時間を最低限に抑える取り組み




- 問題認識の明確化(工期が1日延びる損失を相互に認識)
- 発注者と受注者の情報共有(連携強化)

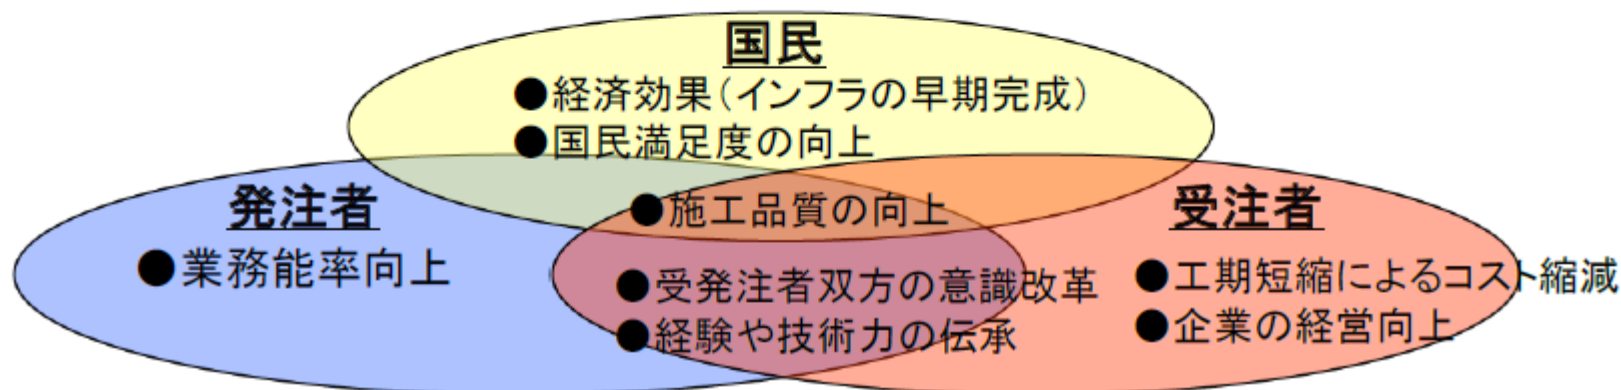

ASPの取り組み


・ASPとは、

公共工事の施工中における、スケジュールや工事書類管理共有機能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データの作成支援機能を備えたアプリケーションソフトをインターネットを通じて公共工事の受発注者にレンタルする事業者のことであり、これを活用することにより効率的に情報共有

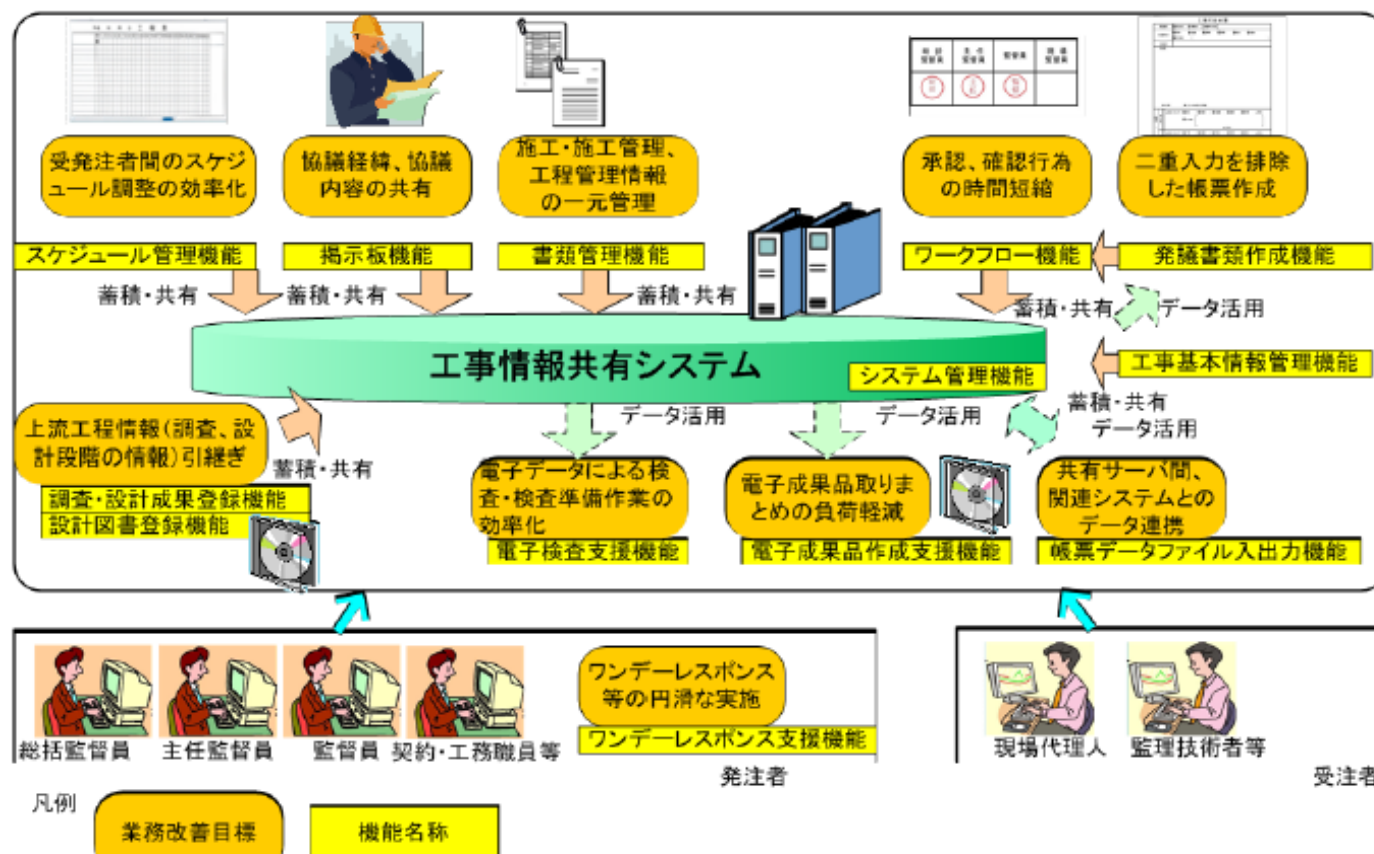

出典：国土交通省

(2) 円滑な施工の確保のための仕組みの一体的運用事例（北陸地方整備局の事例）

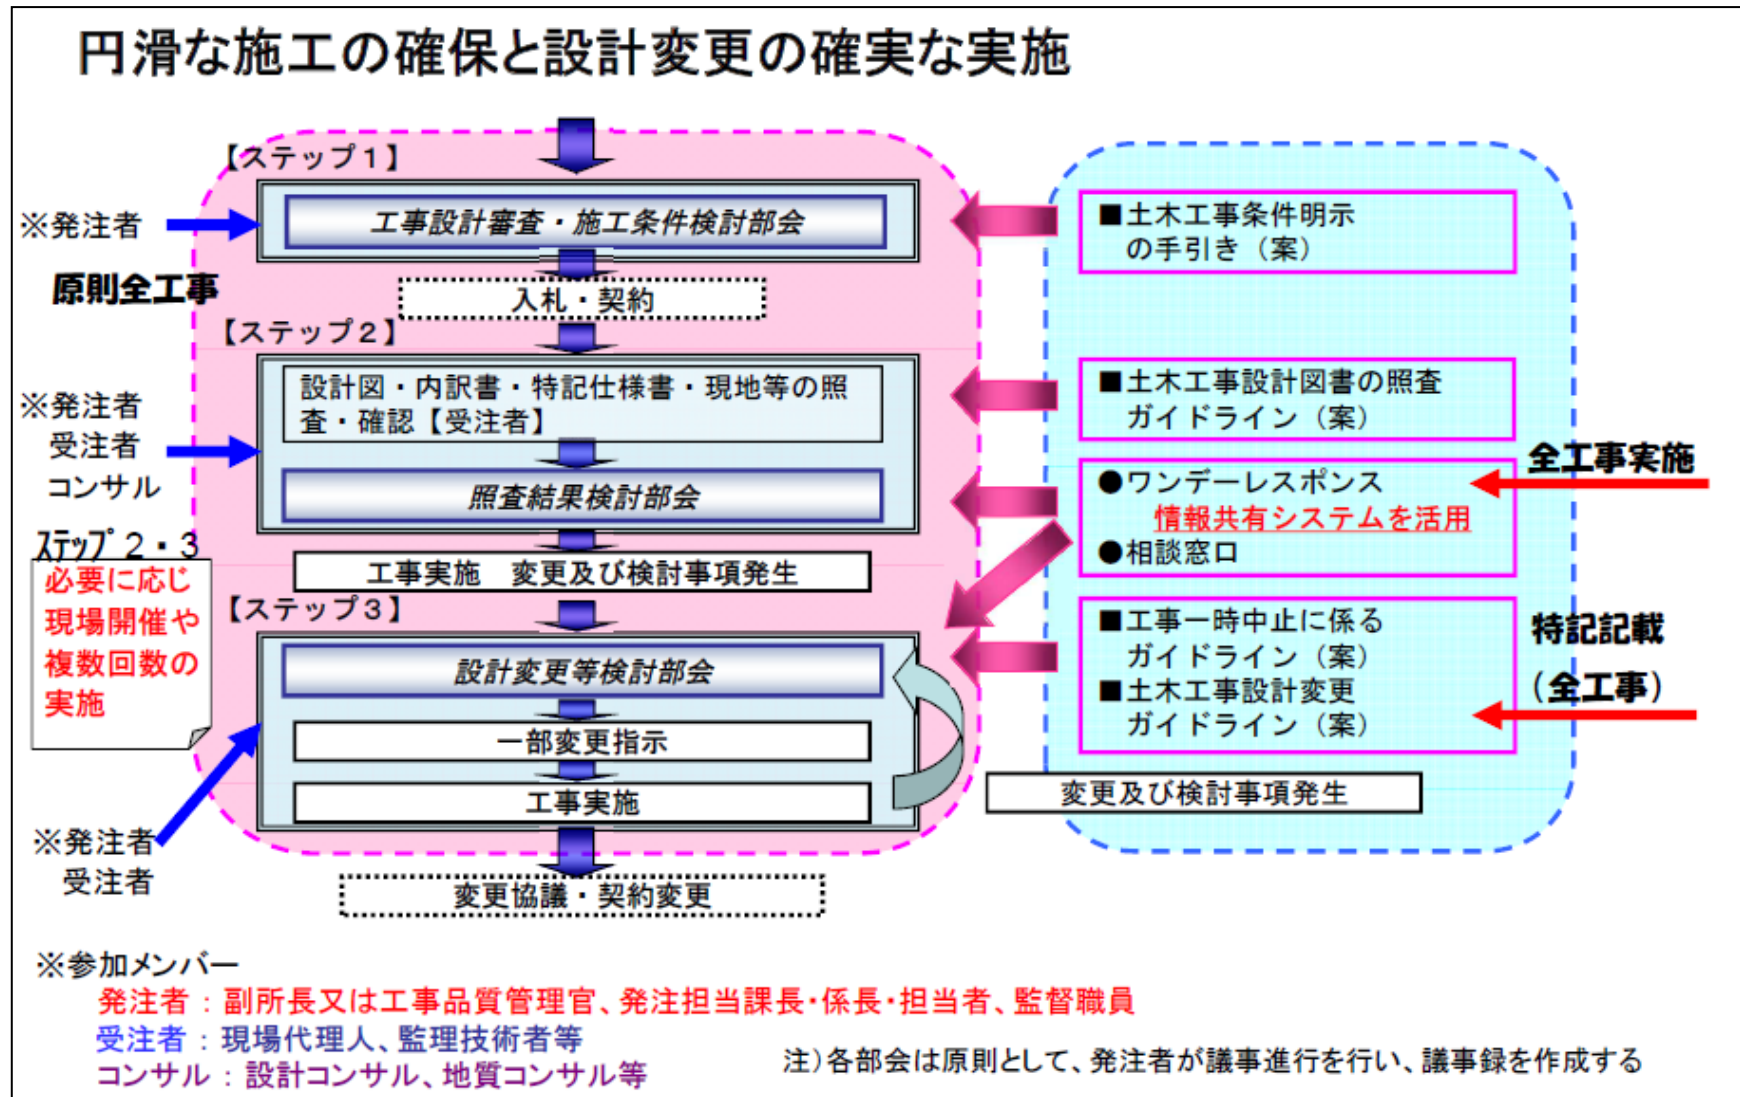

(3) 用語の解説

・設計図書の変更	入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が訂正、変更を行うこと。	共 1-1-1-14
・契約図書	契約書及び設計図書をいう。	共 1-1-1-2
・設計図書	仕様書、図面、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び工事数量総括表。	共 1-1-1-2
・仕様書	各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書の総称。	共 1-1-1-2
・共通仕様書	各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げる程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうちあらかじめ定型的な内容を盛り込んだ図書。	共 1-1-1-2
・特記仕様書	共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書。監督職員が指示、承諾した書面も含む。	共 1-1-1-2
・現場説明書	工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類。	共 1-1-1-2
・質問回答書	入札参加者の契約条件等の質問に対して発注者が回答した書面。	共 1-1-1-2
・指示	契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させること。	共 1-1-1-2
・承諾	契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意すること。	共 1-1-1-2
・協議	書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ること。	共 1-1-1-2
・提出	監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すこと。	共 1-1-1-2
・通知	発注者又は監督職員と受注者又は現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせること。	共 1-1-1-2
・書面	手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または押印をしたもの。	共 1-1-1-2
・確認	契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料によりその内容について契約図書との適合を確かめること。	共 1-1-1-2
・監督職員	総括監督員、主任監督員、監督員の総称	共 1-1-1-2

円滑な施工の確保に関する講習会 テキスト編集委員会

委員長	山 口 修	日本建設業連合会 専務理事
委 員	黒 川 修 治	大林組 東京本店土木事業部統括部長
委 員	安 藤 賢 一	大林組 土木本部本部長室部長
委 員	松 井 紀 尚	鹿島建設 土木管理本部土木工務部生産計画グループ長
委 員	押 川 昌 弘	熊谷組 土木事業本部土木部土木グループ部長
委 員	松 田 賢 二	清水建設 土木事業本部土木東京支店土木生産計画第一部部長
委 員	高 山 暢 彦	大成建設 土木本部土木部工事管理室長
委 員	山 野 博 伸	竹中土木 技術・生産本部技術部課長
事務局	得 田 敦 司	日本建設業連合会 副参事

「円滑な施工の確保に関する講習会」の開催日程

開催日時	支部名	開催場所
7月16日（水）	中国	メルパルク広島 6階 平成の間 広島市中区基町 6-36
7月23日（水）	東北	ハーネル仙台 3階 蔵王B・C 仙台市青葉区本町 2-12-7
7月23日（水）	北海道	北海道建設会館 9階 大会議室 札幌市中央区北四条西3丁目
7月28日（月）	北陸	新潟県建設会館 5階 大会議室 新潟市中央区新光町 7-5
7月30日（水）	四国	香川県建設会館 7階 ホール 高松市磨屋町 6-4
7月31日（木）	関東	東京証券会館 8階 ホール 中央区日本橋茅場町 1-5-8
8月 1日（金）	九州	福岡国際会議場 5階 501号会議室 福岡市博多区石城町 2-1
8月 6日（水）	関西	国民会館 12階 大ホール 大阪市中央区大手前 2-1-2
8月 7日（木）	中部	ウインクあいち 大会議室 名古屋市中村区名駅 4-4-38

MEMO



一般社団法人 **日本建設業連合会**
JFCC JAPAN FEDERATION OF CONSTRUCTION CONTRACTORS

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館内
TEL:03-3553-0701 / FAX:03-3551-4954
<http://www.nikkenren.com/>
